

建设项目竣工环境保护 验收调查表

项目名称：改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）

委托单位：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部

新疆中测众联环保咨询服务有限公司

二〇二一年五月

表一：项目总体情况

建设项目名称	改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）					
建设单位	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部					
法人代表	张华雄	联系人		于波		
通信地址	库尔勒东平安路库尔勒铁路建设指挥部					
联系电话	0996-8642230	传真	/	邮编	841000	
建设地点	新疆维吾尔自治区喀什地区					
项目性质	技改	行业类别		铁路货物运输 G5320		
环境影响报告表名称	改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）					
环境影响评价单位	中环联新（北京）环境保护有限公司					
初步设计单位	/					
环境影响评价审批部门	喀什地区生态环境局	文号	喀地环评字[2021]28 号	时间	2021 年 3 月 16 日	
初步设计审批部门	/	文号	/	时间	/	
环境保护设施设计单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司					
环境保护设施施工单位	中铁一局集团有限公司/中铁十五局集团有限公司					
环境保护设施监测单位	新疆中测测试有限责任公司					
投资总概算（万元）	3026.92	环保投资（万元）		65	实际环保投资占总投资比例	2.15%
实际总投资（万元）	3026.92	环保投资（万元）		65		2.15%
设计生产能力	160km/h	建设项目开工日期			2020 年 4 月 1 日	
实际生产能力	160km/h	投入试运行日期			2020 年 12 月 30 日	
调查经费	/					
项目建设过程	1、2020 年 5 月委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制了《改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）环境影响报告表》；					

	2、2021 年 3 月 16 日取得了喀什地区生态环境局出具的《改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）环境影响报告表的批复》（喀地环评字[2021]28 号）。 3、2020 年 4 月开工建设，2020 年 12 月完工。 4、2021 年 5 月委托新疆中测众联环保咨询服务有限公司对该项目实施项目竣工环境保护调查工作，对受工程建设影响的生态恢复状态、工程环保措施执行情况等进行了重点调查，并委托新疆中测测试有限责任公司进行了噪声、振动监测，在现场调查及监测的基础上编制完成《改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）竣工环境保护验收调查表》。
验收调查依据	（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）； （7）《水电等 9 个行业建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点》（环办[2015]113 号）； （8）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）； （10）《改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）环境影响报告表》（2021.3）； （11）《关于改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）环境影响报告表的批复》（喀地环评字[2021]28 号）（2021.3.16）。

表二：调查范围、重点、环境保护目标和验收标准

调查范围	验收调查范围与项目环境影响评价范围一致。具体内容如下： 生态环境：工程线路两侧 300m 范围、各站段用地界外 100m 以内范围以及取弃土场、施工场地、施工便道和大临工程用地界外 100m 以内范围； 声环境：线路两侧 200m 范围内的学校、住宅； 振动环境：线路两侧 60m 范围内的学校、住宅； 大气环境：本次提速改造工程不涉及既有车站改建；														
调查因子	生态环境：工程沿线取弃土场的防护措施及路基边坡的防护措施；桥涵工程对河流排洪及农田灌溉的影响，耕地、自然植被的保护及恢复； 声环境：等效连续 A 声级（L _{Aeq} ）； 振动环境：铅垂向 Z 振级最大值（VLZ _{max} ）；														
环境敏感目标	根据现场踏勘，本次评价区域内无风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种和保护文物。 本项目对喀什地区段铁路不满足 160km/h 的曲线半径和缓和曲线的 2 处铁路段进行曲线改造（***），对原曲线段增加曲线半径，位置变化较小。本项目两处曲线改造路段沿线不跨越地表河流，不涉及水环境保护目标。周边不涉及声环境、振动敏感目标。本次技改前后，涉及的环境保护目标未发生变化，主要为生态环境保护目标，包括泡泡刺荒漠，国家二级野生保护动物鹅喉羚、塔里木兔，详见下表。 <table><tr><th colspan="3">表 2-1 生态环境保护目标</th></tr><tr><th>保护对象</th><th>敏感目标特征</th><th>主要影响及时段</th></tr><tr><td>泡泡刺荒漠</td><td>工程占用 2.90hm²</td><td>2 处曲线改造造成泡泡刺荒漠的减少，影响时段为施工期</td></tr><tr><td>野生保护动物</td><td>沿线涉及国家二级保护动物 2 种，为鹅喉羚、塔里木兔</td><td>铁路对野生动物通行造成影响。影响时段为营运期</td></tr></table>			表 2-1 生态环境保护目标			保护对象	敏感目标特征	主要影响及时段	泡泡刺荒漠	工程占用 2.90hm ²	2 处曲线改造造成泡泡刺荒漠的减少，影响时段为施工期	野生保护动物	沿线涉及国家二级保护动物 2 种，为鹅喉羚、塔里木兔	铁路对野生动物通行造成影响。影响时段为营运期
表 2-1 生态环境保护目标															
保护对象	敏感目标特征	主要影响及时段													
泡泡刺荒漠	工程占用 2.90hm ²	2 处曲线改造造成泡泡刺荒漠的减少，影响时段为施工期													
野生保护动物	沿线涉及国家二级保护动物 2 种，为鹅喉羚、塔里木兔	铁路对野生动物通行造成影响。影响时段为营运期													
调查	根据现场调查及本工程环境影响因素，当地环境状况的特点，项目周														

重点	围环境敏感点目标无变化，确定本次调查的重点如下： 1.核实本工程实际建设内容与设计方案变更情况； 2.实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况； 3.环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况； 4.环境影响评价文件及审批文件中提出的主要环境影响； 5.工程前期设计阶段及施工期环保措施执行情况； 6.环境质量和主要污染因子达标情况； 7.环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、污染物排放总量控制要求落实情况、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性。 8.验证环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果。 9.工程环境保护投资情况。
----	---

表三：验收执行标准

环 境 质 量 标 准	1.声环境			
	南疆铁路阿克苏至喀什段 1999 年 12 月建成通车，属于既有铁路干线。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），南疆铁路阿克苏至喀什段 2011 年 1 月 1 日前已运营通车，不适用执行 4b 类标准限值，仍应执行 4a 类标准限值。 项目沿线没有划分声环境功能区划。参照声环境功能区划分技术规范（GB/T15190 - 2014）及国家环保总局《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价有关问题的通知》（环发[2003]94 号）：运营期距铁路外轨中心线 30m 处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》及其修改方案（GB12525-90）中昼间 70dB，夜间 70dB 的标准；距铁路外轨中心线 30-60m 处执行《声环境质量标准》中的 4a 类标准；60m 以外执行《声环境质量标准》中的 2 类标准。。具体标准见表 3-1。			
	表 3-1 声环境功能区划细节一览表			单位：dB（A）
	执行类别	标准限值		备注
		昼间	夜间	
	《铁路边界噪声限值及其测量方法》及其修改方案（GB12525-90）表 1	70	70	铁路干线外轨中心线 30m 处
	《声环境质量标准》中的 4a 类标准	70	55	既有铁路干线 30-60m 区域内的各敏感点
	《声环境质量标准》中的 2 类标准	60	50	铁路干线 60m 以外区域的各敏感点
	2.振动环境			
	距铁路外轨中心线 30m 以外区域执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中昼间 80dB，夜间 80dB 的标准。 施工阶段执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“混合区”昼间 75dB，夜间 72dB 的标准。			
	3.环境空气			
	本工程环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标			

污 染 物 排 放 标 准	准及其修改单。							
	表 3-2 环境空气质量标准							单位：μg/m³
	污染物	NO ₂	SO ₂	CO	PM _{2.5}	PM ₁₀	TSP	备注
	24 小时平均	80	150	4000	75	150	300	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准
	1 小时平均	200	500	10000	/	/	/	
1.大气污染物排放标准								
施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。本次曲线改造不涉及车站改造，无燃煤锅炉取暖。								
表 3-3 大气污染物监控浓度限值								单位：mg/m³
项目	NO _x （无组织）			颗粒物（无组织）		备注		
限值	0.12（周界外浓度最高点）			1.0		GB16297-1996 中二级标准		
2.水污染物排放标准								
本次曲线改造不涉及车站，运营期无新增污水排放。施工期营地内采用卫生厕所进行处理，委托沿线环卫部门定期清运统一处置，不外排。								
3.噪声排放标准								
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。声环境执行标准见表 3-4。								
表 3-4 声环境详细执行标准一览表								
标准名称				执行类别		主 要 指标	标准限值（dB（A））	
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）				标准限值		L _{Aeq}	昼间 70/夜间 55	
4.固体废物								
本项目固体废弃物执行 2020 年 9 月 1 日起施行的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定。								

总量控制指标	无。
--------	----

表四：工程概况

项目名称	改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程 (喀什地区段 2 处曲线改造工程)		
项目地理位置 (附地理位置图)	改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）位于喀什地区巴楚县、伽师县境内，桩号为***段。项目地理位置图见附图 1。		
主要内容及规模：			
1.项目内容及规模			
本次喀什地区段共有 2 处曲线改造工程，主要为：***段改造引起的路基、桥涵等土建工程。总投资 3026.92 万元，占地面积 29000m²。			
(一) 铁路主要技术指标			
铁路等级： I 级；			
正线数目：单线、预留复线条件；			
速度目标值和最小曲线半径：160km/h；最小曲线半径为 1600m；			
限制坡度：6‰；			
机车类型：货运 DF _{8B} ，客运 DF ₁₁ 。			
(二) 路基			
(1) 既有路基改造段落合计 2 处（***），长 1449.72m。			
(2) 盐渍土地基处理 398.1m。			
(3) 拆除还建既有防护栅栏 0.63km。			
表 4-1 路基主要工程数量表			
工程项目		工程数量	
		单位	改建/单绕
区间土石方	填方	m³	68464
盐渍土地基处理	挖除换填粗粒土	m³	2964
	中粗砂	m³	1797
	复合土工膜	m²	8985
防护栅栏	移设防护栅栏	Km	0.63
用地	征收用地	hm²	2.90

	临时用地	hm ²	7.07
--	------	-----------------	------

（三）桥涵

新建中桥 3 座 192.3m，新建箱形桥 1 座 92m²，新建小桥 1 座 30.7m，接长涵洞 2 座 9m。

（四）通信

改线段存在新建桥涵区段，因此将铁路两侧光电缆均割接处理。本段迁改工点表见表 4-2。

表 4-2 迁改工点表

序号	起讫里程		线路情况			线间距	改移方向	影响光缆类型	处理方式	长度（km）
			长度（km）		改建类型					
			既有线路	改建线路						
1	***	***	1	1	并行改建	21.6	右	7×4,8芯 16芯, 32芯	割接	2
2	***新建 5-16m 梁桥									
3	***新建 1-16m 梁桥									
4	***新建 1-16m 梁桥									
5	***新建 2-16m 梁桥									
6	***	***	1.2	1.2	并行改建	-33	左	7×4,8芯 16芯, 32芯	割接	2
7	***新建 2-16m 梁桥									

（五）土石方数量

本段工程土石方总量 71428m³，其中填方 68464m³，挖方 2964m³，借方 68464m³，弃土 2964m³，来源于路基挖除的盐渍土和桥涵挖方。工程取土来源于位于***的 G3012 阿克苏至喀什高速公路取土场，弃土全部回填至取土场，不单独设置弃土场。

（1）路基土石方

本次喀什地区段 2 处曲线改造工程路基的主要土石方量来自于土方开挖及回填。经过查阅可研报告，路基共计开挖土石方量为 2934m³，为盐渍土，全部回填至取土场；路基土石方填筑量为 68464m³。

（2）桥涵土石方

本次喀什地区段 2 处曲线改造工程桥涵的主要土石方量来自于土方开挖，开挖

量为 30m³，全部回填至取土场。

表 4-3 土石方平衡表 单位：m³

序号	项目	土石方开挖	土石方填筑	弃土	取土场借方量
1	路基	2934	68464	2934	68464
2	桥涵	30	0	30	0
	合计	2964	68464	2964	68464

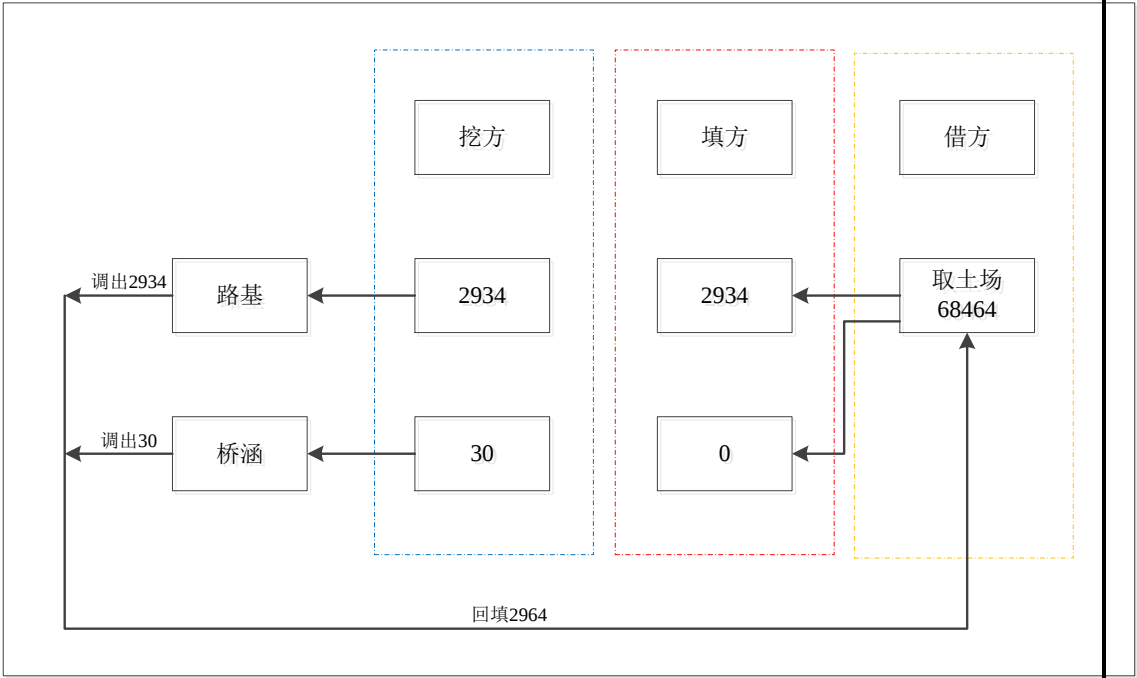


图 1 土石方平衡图

(六) 主要工程坐标

本项目实施主要工程坐标见下表所示。

表 4-4 主要工程坐标汇总表

序号	工程	中心点桩号	中心点坐标
1	中桥 1	***	***
2	中桥 1	***	***
3	中桥 1	***	***
4	箱形桥	***	**
5	小桥	***	**
6	取土场	***	**

2. 货流密度及列车对数

本线预测的区段货流密度和列车对数详见下表 4-5、表 4-6。

表 4-5 南疆线阿喀段货流密度表 单位：万吨，对/日

区段	2030 年			2040 年		
	货流密度		客车对数	货流密度		客车对数
	上行	下行		上行	下行	
阿克苏-阿图什	510	580	12	1065	952	18

表 4-6 南疆线阿喀段客货列车对数

单位：对/日

年度	区段	列车对数（对/日）				
		客车	集装箱	直货	摘挂	合计
2030 年	阿克苏-阿图什	12	1	5	1	19
2040 年	阿克苏-阿图什	18	2	10	1	32

实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因：

本工程为改造工程，工程建设的实际工程内容与环境影响评价阶段工程内容基本无变化。

按照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）及《关于印发新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定的通知》对工程梳理的结果表明，工程在性质、规模、地点、生产工艺、主要环保措施等方面均不存在重大变动。

生产工艺流程（附流程图）：

本项目喀什地区段 2 处曲线改造工程主要为：2 处曲线改造引起的路基、桥涵等土建工程。本项目工艺流程及产污环节见下图。

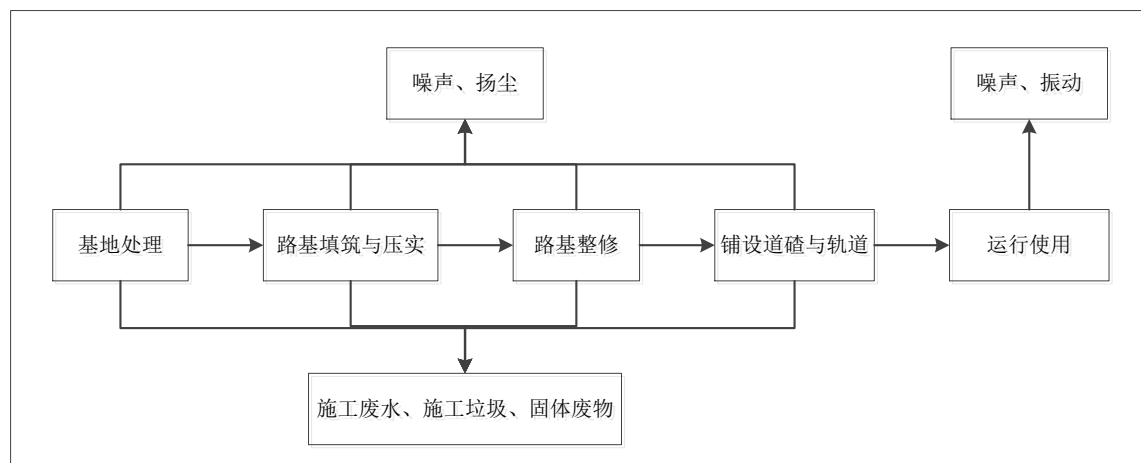


图 2 项目施工期工艺流程及产污环节

工程占地:

(1) 永久征地

本次工程永久征地主要为线路改线引起新增用地，征收用地 2.90hm²，其中，桥涵占用 0.2322hm²，路基占用 2.6678hm²。

(2) 拆迁

不涉及拆迁建筑物。

(3) 临时工程

取土场：本项目 2 处曲线改造以填方为主，为了减缓取土对沿线生态环境影响，利用 G3012 阿克苏至喀什高速公路取土场 1 处，位于**，占地 5.13hm²，占地类型为未利用土地。本项目路基挖除废弃盐渍土 2964m³，取土量为 68464m³，弃方量远小于取土量，工程可利用取土场作为弃土场，不需设置专用弃土场。具体见表 4-7。

表 4-7 取土场位置一览表

序号	桩号	位置	取土量 (m ³)	占地 (hm ²)	弃方量 (m ³)
				未利用土地	
1	**	右侧 500m	68464	5.13	2964

施工便道：新建施工便道 3.87km，便道宽 5m，共计征地 1.94hm²，为取土场通往主体工程便道。本项目施工便道占地为未利用土地，由于 2 处曲线均位于无人区，无既有道路可以利用，不得不新建部分施工便道接入曲线改造段。施工便道未设置地面硬化，平整道路，留待自然恢复。

施工场地：设置 1 处施工场地，位于**，租用 G3012 阿克苏至喀什高速公路取土场范围设置，占地 5.13hm²，集中布设，含拌合站、材料厂等。现状已拆除，并移交租赁方恢复。

工程环保投资明细：

本项目投资总金额为 3026.92 万元，环保投资 65 万元，环保投资占总投资 2.15%，具体详见下表。

表 4-8 曲线改造工程环保措施及投资估算表

序号	项目	采取的措施	环评概算投资估算（万元）	实际投资（万元）
一	生态环境保护		16	16
1	取土场、施工场地、施工便道生态恢复	平整场地、回覆表土、自然恢复	16	16
二	水环境		10	10
1	施工场地生活污水、生产废水处理	生活污水采用卫生厕所处理，生产废水采取三级沉淀池处理	10	10
三	大气环境		20	20
1	施工期降尘	施工营地、便道洒水措施	10	10
2	拌合站除尘装置	拌合站设置 2 台脉冲布袋除尘装置	10	10
四	固体废物		1	1
1	施工场地垃圾处理	施工营地地活垃圾、建筑垃圾清运	1	1
五	环境监（控）测		5	5
1	环境监测	按照环境监测、监控计划表的项目进行	5	5
六	环境监理		5	5
七	竣工环保验收		8	8
	合计		65	65

与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施：

一、施工期

根据现场调查，项目施工期间对环境产生的影响主要表现在生态环境，产生的主要污染物有：废气、废水、噪声、振动和固体废物。

1.生态环境影响

本工程既有线已修建多年，本次曲线改造不占用耕地，本次曲线改造工程对农业区基本没有不利影响，植被破坏面积也较少，为点状分布，对区域生态环境影响较小。

（1）对植被影响及保护措施

本次工程主要为线路改线引起新增用地，征收永久用地 2.90hm²，均为泡泡刺荒漠，占用土地为既有铁路两侧土地，占用面积较小，对沿线土地资源的影响较小。建设单位已缴纳森林植被异地补偿经费，纳入征地拆迁费用中，由地方政府负责。

施工前，对永久占地表土进行剥离，用于临时占地绿化。施工期严格控制施工范围，施工便道进行铺撒砾石处理，施工结束后，清除表层砾石，进行土地平整，播撒草籽，待自然恢复。

（2）对野生动物影响及保护措施

①施工期多次组织宣传教育会议，施工单位制定严格的管理制度和奖惩制度，严禁猎杀野生动物。

②新建施工便道选择在荒地或裸地。

③施工单位加强卫生防疫工作，避免疾病蔓延。

（3）临时占地影响及保护措施

1）取土场、弃渣场

本项目 2 处曲线改造以填方为主，为了减缓取土对沿线生态环境影响，利用 G3012 阿克苏至喀什高速公路取土场 1 处，位于**，占地 5.13hm²，占地类型为未利用土地。本项目路基、桥涵挖除弃土 2964m³，取土量为 68464m³，弃方量远小于取土量，工程可利用取土场作为弃土场，不需设置专用弃土场。

全线实际使用取土场 1 处，施工前剥离表土，临时堆放在取土场附近，并采取苫盖措施，现状已完成场地平整并回覆表土，削缓边坡，播撒草籽，留待自然恢复。

2）施工场地

本段施工场地利用既有取土场区布设，不新增占地，施工期结束后交由租赁方恢复。

本工程生态环境保护措施落实情况见表 4-9。

表 4-9 生态环境保护措施落实情况调查

环评及其批复中提出的环境保护措施	措施落实情况
生态：本次曲线改造不占用耕地,本段征收用地 2.90hm,全部泡泡刺荒漠。施工生产生活区内主要有停放的施工机械、砂石料生产系统、拌和系统、施工期间施工人员居住的临时房屋及其它施工辅助工程。施工过程中采取洒水降尘,防止水土流失。 施工期间为严格控制和管理运输车辆及重型机械的行走范围,以防破坏地表结皮和植被,引发水土流失,需限制施工便道车辆的行驶范围。施工结束后,清除表层砾石,进行土地平整,播撒草籽,待自然恢复。	已落实。 施工期多次组织宣传教育会议,施工单位制定严格的管理制度和奖惩制度,严禁猎杀野生动物、采摘野生植物。施工便道进行铺撒砾石处理,施工结束后,清除表层砾石,进行土地平整,播撒草籽,待自然恢复,施工期未发现随意碾压周边道路行为;取土场已采取平整削坡措施,留待自然恢复。未设置施工营地;

2.声环境影响

工程施工期声环境影响主要表现在施工过程中的各种设备噪声,噪声源主要为工程建设过程中使用的推土机、挖掘机和来往运输车辆。

①施工单位在施工过程中使用低噪声的机械设备,并在施工期及时进行保养维护,对设备使用人员进行了培训,严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工作业,避免了高噪设备集中施工造成局部噪声过高。

③运输车辆进出工地时均低速行驶,少鸣笛或不鸣笛;夜间未进行施工作业。

本工程施工期声环境保护措施落实情况见表 4-10。

表 4-10 施工期声环境保护措施落实情况调查

环评及其批复中提出的环境保护措施	措施落实情况
噪声：选用低噪声设备和工艺;加强检查、维护和保养机械设备,保持润滑,紧固各部件,减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固,并于地面保持良好接触,有条件的应使用减震机座,降低噪声。合理划定运输路线,适当限制大型载重车的车速,定期对运输车辆维修、养护。加强施工管理,合理安排施工作业时间,严格按照施工噪声管理的有关规定执行。严禁夜间施工,昼间进行高噪声施工时应尽量选择敏感时段进行,最大程度的减小施工噪声对周围环境敏感目标的影响。	已落实。 施工单位在施工过程中使用低噪声的机械设备类型,高噪声设备采取了减震、隔声等措施,并在施工期及时进行保养维护,对设备使用人员进行了培训,严格按操作规范使用各类机械,夜间未进行施工作业。施工期未发生噪声环保投诉事件。

3.施工振动环境影响

施工期振动环境影响主要有打桩、钻孔、空压机、大型挖掘机、回填中夯具的使用以及重型车辆在道路上的行驶等。施工单位在施工过程中对机械设备及时进行保养维护，对设备使用人员进行了培训，严格按操作规范使用各类机械。

4.施工期大气环境影响

施工期大气污染源主要来源于站场施工、取弃土、汽车运输等产生的扬尘和各种机械设备产生的尾气，施工期以扬尘污染为主，特别是运输车辆引起的扬尘污染强度较大。

①施工单位设置料棚，施工期粉性材料堆放在料棚内，施工场地及施工便道定期洒水，施工期每天洒水 2-3 次；

②运输车辆进出施工区域尽量依托临近道路行进，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并要求运输车辆减缓行车速度；

③加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少了烟尘和尾气的排放；

④施工场地采用封闭式施工方法，拌合站设置了 2 套 DMC 脉冲式布袋除尘装置，粉尘经脉冲布袋式除尘装置收集处理后，能满足达标排放；

本工程施工期大气环境保护措施落实情况见表 4-11。

表 4-11 施工期大气环境保护措施落实情况调查

环评及其批复中提出的环境保护措施	措施落实情况
废气 封闭式施工,上料仓设置顶盖,三面均设置围挡及隔板加高,减少水泥、砂、石灰等物料堆放过程中扬尘对外环境产生影响。本项目建有 1 座拌合站,设 2 套拌合装置,每套拌合装置均设置一套 DMC 脉冲式布袋除尘装置。施工拌合过程中产生的粉尘经脉冲布袋式除尘装置收集处理后,满足达标排放。施工场地采用封闭式施工方法,将工地与周围环境分隔,在工地四周设置围护栏,以起到隔阻工地扬尘对周围环境的影响。道路及施工场地要每天定期洒水,抑制扬尘产生,在大风日加大洒水量及洒水次数。保持施工车辆及路面清洁,避免大风天气作业。	已落实。 施工场地及施工便道定期洒水,施工期每天洒水 2-3 次;大风天气未开展施工作业,施工场地设置料棚,施工期粉性材料堆放在料棚内。混凝土、道砟均为商购。运输车辆已落实篷布遮盖。施工现场已设置围挡,开挖废弃土方合理堆放,无随意抛洒现象。施工场地采取封闭式施工,拌合站设置了 2 套 DMC 脉冲式布袋除尘装置,粉尘经脉冲布袋式除尘装置收集处理后,能满足达标排放。

5.施工期废水影响

本工程新建桥梁、涵洞工程量较小；道砟采取商购，选择正规石料场进行采购，拉运至施工现场，直接进行铺设，不在现场储存；钢轨由火车拉运至施工现场，直接进行铺设；施工现场不存放柴油、汽油等油品，每次由加油站按需运至施工现场进行加油作业。项目未设置施工营地，租用现有居民用房，生活污水依托居民现有污水设施处置排放。

本工程施工期水环境保护措施落实情况见表 4-12。

表 4-12 施工期水环境保护措施落实情况调查

环评及其批复中提出的环境保护措施	措施落实情况
废水：营地内生活污水采用卫生厕所进行处理,委托沿线环卫部门定期清运集中收集送指定地点处置。在场内设置三级沉淀池,对车辆冲洗废水、设备冲洗废水等进行沉淀处理,分离出水用于喷洒场地或道路。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨淋措施,及时清扫施工运输过程中遗洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷,污染周边环境。	已落实。 项目未设置施工营地，租用沿线附近居民用房，生活污水依托现有设施处置。

6.施工期固体废物影响

施工期主要固体废物为建设过程中生活垃圾和工程弃土。

生活垃圾设置垃圾桶密闭收集，委托当地环卫部门定期拉运处置。

工程弃土全部回填至取土场。由于本项目弃土量较少，取土场容积能满足弃土量需求。

本工程施工期固体废物环境保护措施落实情况见表 4-13。

表 4-13 施工期固体废物环境保护措施落实情况调查

环评及其批复中提出的环境保护措施	措施落实情况
固废：对生活垃圾应加强管理，用垃圾桶密闭收集，设置专车定期收集施工人员的生活垃圾，集中密闭外运，严禁就地抛洒及无组织排放。禁止生活垃圾用于回填，以防止对地下水的污染。工程弃土全部回填至取土场。	已落实。 项目设置有垃圾桶，生活垃圾集中收集至垃圾桶，定期送至环卫部门集中处理。施工废气土方合理堆放运至取土坑；建筑垃圾集中收集后运至指定填埋场回填处理。

二、运营期

1.声环境

本项目属于提速改造项目，改建后线路位置维持原有状况不变和评价范围内的建筑物分布状况不变，沿线改造段无声环境敏感点存在。

验收调查阶段，根据新疆中测测试有限责任公司于 2021 年 4 月 22~23 日监测数据表明：监测数据表明：距铁路外轨中心线 30m 处昼、夜间测量噪声均满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》及其修改方案（GB12525-90）标准要求；距铁路外轨中心线 60m 处昼、夜间测量噪声满足《声环境质量标准》中的 4a 类标准要求；距铁路外轨中心线 120m 处的测点昼、夜间测量噪声满足《声环境质量标准》中的 2 类标准要求。

2. 振动环境

本项目属于提速改造项目，改建后线路位置维持原有状况不变和评价范围内的建筑物分布状况不变，沿线改造段无振动环境敏感点存在。

验收调查阶段，根据新疆中测测试有限责任公司于 2021 年 4 月 22~23 日监测数据表明，现状受铁路振动干扰的环境振动值均低于“80dB”标准限值，满足标准要求。

3. 大气环境影响

本段曲线改造项目不涉及车站，本项目运行期主要空气污染源是列车排放的少量尾气，且本项目周边无大气环境保护目标。

4. 水环境影响

本次提速改造工程不涉及车站改建，上轮建设新开 5 处会让站生活污水、取暖设施、固废处理均按环评及批复要求落实，本次改造运行期无生活废水和生产废水产生，且本项目周边不涉及地表水体，因此，本项目运行对地表水环境无影响。

5. 固体废物

上轮建设新开 5 处会让站生活污水、取暖设施、固废处理均按环评要求执行，本段曲线改造项目 2 处曲线运行期无生活垃圾产生本次提速改造工程不涉及车站改建，运行期无生活垃圾产生，对环境无影响。

6. 生态环境

本次提速改造工程将在全线荒漠区铁路两侧建设全封闭围栏，其中国家二级保护动物鹅喉羚活动范围在新和至阿克苏荒漠区路段，国家二级保护动物塔里木兔活

动范围在农田绿洲区。

（1）对鹅喉羚影响

南疆铁路阿克苏段铁路为单线铁路，铁路与 G314、G3012 伴行，3 条交通线均没有专门设置鹅喉羚动物通道。线路南侧人为活动较多，北侧为荒漠地带，鹅喉羚受到 3 道交通线路阻隔，基本不会通过公路进入铁路沿线，仅活动在线路北侧荒漠平原内。本次曲线改造维持既有线路，仅 2 处曲线进行改建，属于点状工程，不会影响其他线路，对鹅喉羚不会产生新的影响。

（2）对塔里木兔影响

塔里木兔活动范围在农田绿洲区，其体型较小，可以通过涵洞或者桥梁通行，对其活动没有影响。

运行期对野生动物的负面影响不大，未发生捕猎保护动物的现象。

表五：环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）：

一、施工期

1.生态环境影响分析

（1）生态功能区划符合性分析

本工程曲线改造后，极大提高了阿克苏至喀什段客、货运运输能力。工程位于喀什三角洲绿洲农业盐渍化敏感生态功能区，以农业生态为主。

本工程既有线已修建多年，本次曲线改造不占用耕地，本次曲线改造工程对农业区基本没有不利影响，植被破坏面积也较少，为点状分布，对区域生态环境影响较小，总体没有改变生态功能区环境，符合生态区总体发展的要求，与功能区划没有冲突。

（2）对植被影响分析

1) 生物量估算

本段征收用地 2.90hm^2 ，全部泡泡刺荒漠。

根据朴世龙《中国草地植被生物量及其空间分布格局》（2004）中全国各地森林、草地生物量等资料，参考新疆当地有关部门所作的生态损失调查研究成果，结合沿线生态环境现状的调查，包括林木的生长情况、荒漠植被的生长情况对照有关资料，泡泡刺荒漠生物量按 $5.7\text{t}/\text{hm}^2$ 计算。项目新征用地生物量损失见下表。

表 5-1 拟建项目植被生物量损失估算表

序号	林分类型	面积 (hm^2)	平均生物量 (t/hm^2)	生物量 (t)
1	泡泡刺荒漠	2.9	5.7	16.53

从上表的计算结果可以看出，工程建设后，将造成评价范围内植被生物量损失约 16.53t，其中主要为泡泡刺荒漠。由于全线占用植被为地方常见物种泡泡刺，占用面积相对区域面积较小，对自然植被影响较小。

（3）土地利用现状影响分析

新增用地主要为未利用土地，占用土地为既有铁路两侧土地，占用面积较小，

对沿线土地资源的影响较小。

工程选用取土场 1 处，主要为未利用土地，利用既有取土场，地表植被较少，属于区域面积较广的土地利用类型，工程取土为点状分布，取土结束后，采取削坡，场地清理、平整、播撒草籽、自然恢复，取土场能逐步恢复为原有土地类型。

（4）对野生动物的影响分析

本次曲线改造工程施工局限在既有线路两侧。线外施工主要在取土场，取弃土影响范围相对较小，对周边整体环境影响有限。但临时占地仍可能产生以下影响：

1）在沿线的临时占地和取土，将扰动地表，破坏荒漠植被，使周围野生动物远离施工区域觅食。

2）如果随意丢弃施工营地产生的生活垃圾，可能会造成野生动物误食，对其产生不利影响。

3）如果宣传教育和管理措施不到位，可能会发生施工人员猎杀野生动物的现象，对沿线野生动物造成伤害。

4）本项目东侧 G3012 高速公路距离山林较近，本项目采取桥涵与 G3012 高速公路项目桥涵并行的措施，减少对野生动物迁移的影响。

（5）临时占地影响分析

1）取弃土场占地环境影响分析

①取弃土场的位置及合理性分析

本项目 2 处曲线改造以填方为主，为了减缓取土对沿线生态环境影响，利用 G3012 阿克苏至喀什高速公路取土场 1 处，位于***，占地 5.13hm²，占地类型为未利用土地。本项目路基、桥涵挖除弃土 2964m³，取土量为 68464m³，弃方量远小于取土量，工程可利用取土场作为弃土场，不需设置专用弃土场。

根据调查，本项目取土区地表基本无植被，且位于无人区，周围无村庄、保护区等敏感目标，环境合理。

②弃渣合理性分析

本项目工程弃土全部为路基挖除的盐渍土，弃土量小于取土量，取土场容量满足弃土需求，弃土没有新增临时占地，符合环保要求。因此，利用取土场弃土是合理的。

表 5-2 全线取土场合理性分析

序号	取土场位置、桩号	取土量 (m^3)	占地 (hm^2)	地类	环境合理性分析	恢复措施
1	***	68464	5.13	未利用土地	利用既有取土场，无保护植被分布，取土区地表基本无植被，位于无人区，周围无村庄、保护区等敏感目标，环境合理	削坡，场地清理、平整、自然恢复

③ 取弃土场环境保护措施

本项目取弃土场采取以下环境保护措施：

A)弃料回填

施工前，先将取土场表层土剥离暂存，待取土结束后再将表土均铺在平整后的取土场内，采取绿化方式恢复植被，以保护环境。

沿线弃渣利用本工程取土场进行弃渣，先将弃渣同取土场表土临时堆置于取土场占地内，施工完毕后将弃渣同取土场表土回填。本项目弃渣总量 2964m^3 ，全部填于取土场内。

B)土地平整

工程结束后，对沿线取土场进行土地平整，共计土地平整面积 5.13hm^2 。

C)施工过程中采取的临时措施

i 清理表层土

取土前，主体工程对取土场采取表层土进行剥离，这些表土在取土场角落临时堆放，并定时对其洒水。

ii 渣面拍实

为防止临时堆放的取土场表土在施工期间发生水土流失，施工期间对取土场清理表土和工程弃渣采取表面拍实，在施工期间清表堆置完毕后，及时对临时堆土进行拍实，可就近利用铲车、挖掘机等施工机械进行拍实。

D)取弃土场恢复措施

取土场在施工结束后应进行恢复，主要包括削坡（边坡 1:3）、场地清理、平整、覆土、播撒草籽等措施，恢复至本工程建设前的植被覆盖度。

取土结束后，将表土均铺在平整后的取土场内，采取绿化方式恢复植被，以保

护环境，对取土场播撒泡泡刺草籽进行绿化，撒播草籽含量每平方米不小于 15g 到 20g，草籽埋入深度不低于 5cm，为使草籽均匀分布，可将草籽与砂混合。

草籽种植绿化还需满足以下要求：

- i 撒播草籽土质应为种植土，厚度不少于 30cm 厚；
- ii 植草应在天气和灌溉条件适合的情况下进行；
- iii 植草范围内必须保持无杂草，可提前 2 星期进行除草；
- iv 植草完毕后应浇水养护且不得过量浇水或水侵；
- v 经常性施肥和除病虫害；
- vi 最终植被覆盖度应达到 5%。

②采取的环境保护措施

A)施工场地土地平整、植被恢复

施工生产生活区内主要有停放的施工机械、砂石料生产系统、拌和系统、施工期间施工人员居住的临时房屋及其它施工辅助工程。施工完毕后通过对非永久占地区临时占地采取土地平整措施，地表基本可免受水土流失。场地平整后，

覆盖表土，播撒草籽，待自然恢复。最终植被覆盖度应达到 5%。

B)施工过程中采取的临时措施

洒水降尘：在施工生产生活区，由于施工人员及施工机械的扰动，容易产生扬尘，造成水土流失，尤其是在大风天气，需要对地面进行不定期的洒水降尘，以防止水土流失。

C)施工便道生态保护与恢复措施

为保障施工道路的畅通，在施工准备期施工便道进行铺撒砾石处理。

布设限制性彩条旗：施工期间为严格控制和管理运输车辆及重型机械的行走范围，以防破坏地表结皮和植被，引发水土流失，需限制施工便道车辆的行驶范围，因此在施工道路两侧拉醒目彩条旗作为车辆行驶的边界，以避免增加对地表的扰动。工程完工后，将彩条旗卷起、收集装袋，可重复利用到其它工程中。

洒水降尘：在施工便道区，由于施工机械的扰动，容易产生扬尘，造成水土流失，尤其是在大风天气，需要对地面进行不定期的洒水降尘，以防止水土流失。

施工结束后，清除表层砾石，进行土地平整，播撒草籽，待自然恢复。最终植

被覆盖度应达到 5%。

2. 施工噪声环境影响分析

施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在距施工场地 50m 范围内，夜间将主要出现在距施工场地 300m 范围内。根据现场调查，项目 2 处曲线改造段周边没有居民分布。

项目施工期影响是短期、不连续的，采取施工机械位置和合理安排时间，减噪、隔声措施后，可降低影响。

建议施工期采取以下噪声防治措施，最大限度地减少噪声对环境的影响：

（1）选用低噪声设备和工艺；加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并于地面保持良好接触，有条件的应是用减震机座，降低噪声。

（2）合理划定运输路线，适当限制大型载重车的车速，定期对运输车辆维修、养护。

（3）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。严禁夜间施工，昼间进行高噪声施工时应尽量选择不敏感时段进行，最大程度的减小施工噪声对周围环境敏感目标的影响。

3. 施工振动环境影响分析

本工程建设在施工中产生的振动，对环境的影响主要来自振动型作业，主要有打桩、钻孔、空压机、大型挖掘机、回填中夯具的使用以及重型车辆在道路上的行驶等。除冲击型打桩作业外，其它施工作业和建筑设备产生的振动一般距振源 20-30m，VLz 值为 70-75dB，可达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中“混合区”的环境振动标准。

4. 环境空气

施工期大气污染源主要来源于路基换填作业、取弃土、碎石作业、汽车运输等产生的扬尘和各种机械设备产生的尾气，结合本线所经地区气候干燥、风大沙多及地表以松散砂土为主的特点，可确定施工期以扬尘污染为主，特别是运输车辆引起的扬尘污染强度较大，其污染影响将持续发生在整个施工期。

据有关文献资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆行驶产生，约占扬尘影

响总量的 60%，但这与道路状况有很大关系。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在 100m 以内。如果施工期间对车辆行驶的路面实施增湿作业，每天增湿 4-5 次，可使扬尘量减少 70% 左右，其抑尘效果显而易见。

为保证周围空气环境少受粉尘污染影响，施工时要做到：粉性材料堆放在料棚内，施工工地定期洒水。在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对空气环境不会造成影响。

5. 施工期废水影响分析

施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。此外还有施工人员的生活污水。

施工期采取以下防护措施：

（1）营地内生活污水采用卫生厕所进行处理，委托沿线环卫部门定期清运集中收集送指定地点处置。

（2）在场内地内设置三级沉淀池，对车辆冲洗废水、设备冲洗废水等进行沉淀处理，分离出水用于喷洒场地或道路。

（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中遗洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染周边环境。

（4）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。

通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染。

6. 施工期固体废物的环境影响分析

施工期主要固体废物为建设过程中生活垃圾和工程弃土。本项目在施工中应采取如下处置措施：

（1）对生活垃圾应加强管理，用垃圾桶密闭收集，设置专车定期收集施工人员的生活垃圾，集中密闭外运，严禁就地抛洒及无组织排放。禁止生活垃圾用于回填，以防止对地下水的污染。

（2）工程弃土全部回填至取土场。由于本项目弃土量较少，取土场容积能满足弃土量需求。

经采取上述措施后，施工期固体废弃物对外环境造成的影响较小。

二、运营期

1. 噪声

根据《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见》（铁计[2006]44 号文），本项目属于提速改造项目，改建后线路位置维持原有状况不变和评价范围内的建筑物分布状况不变，适合采用比例预测法。以敏感点噪声现场实测的噪声数据为基础，根据工程前后声源的变化和不相干声源声能叠加的声学理论，进行铁路噪声的预测。本项的预测主要考虑的是列车数量变化对现状监测结果的修正。本次评价采用的噪声源强见下表。

表 5-4 列车噪声源强表

车型	车速 (km/h)	源强 (dB)	线路条件
旅客列车	100	79.5	线路条件：I级铁路，无缝、60kg/m 钢轨，轨面状况良好，混凝土轨枕，有碴道床，平直线路。路堤 1m 高。桥梁 11m 高，简支 T 型梁，盘式橡胶支座。 参考点位置：距列车运行线路中心 25m，轨面以上 3.5m 处。
	110	81.0	
	120	82.0	
	130	83.0	
	140	84.0	
	150	85.0	
	160	86.0	
货物列车	50	74.5	
	60	76.5	
	70	78.5	
	80	80.0	
	90	81.5	
集装箱车	50	73.5	
	60	75.5	
	70	77.5	
	80	79.0	
	90	80.5	

针对本线实际情况，不同区段、不同工程形式、不同路基高度下，本工程纯铁路噪声的等效声级预测结果见下表：

表 5-5 沿线无遮挡噪声等效声级

单位：Leq (dBA)

路基形	轨面高	距外轨距离
-----	-----	-------

式	度（m）	30m		60m		90m		120m	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
路堤	6	63.3	59.0	58.8	54.5	56.0	51.8	55.5	51.3

注：预测环境条件为空旷地、无建筑物遮挡、地面上 1.2m。

本次评价对本工程曲线改造处噪声达标距离进行预测，可以为铁路沿线的土地利用和规划提供参考。本工程纯铁路噪声达标距离预测见下表。

表 5-6 无遮挡时铁路噪声达标距离预测表

路基形式	轨面高度（m）	距外轨距离							
		70dB		60dB		55dB		50dB	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
路堤	6	<5	<5	25	16	58	46	126	89

2. 振动

根据设计中推荐的速度目标值和《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值与治理原则指导意见》铁计[2006]44 号；本次评价采用的噪声源强见表 5-7。

表 5-7 振动源强

振源种类	速度（km/h）	VLzmax（dB）	适用条件
旅客列车	50-70	76.5	线路条件：I级铁路，无缝、60kg/m 钢轨，轨面状况良好，混凝土轨枕，有碴道床，平直、路堤线路。 轴重：21t； 地质条件：冲积层。 参考点位置：离列车运行线路中心 30m 的地面处。
	80-110	77.0	
	120	77.5	
	130	78.0	
	140	78.5	
	150	79.0	
	160	79.5	
货物列车	60-70	78.0	线路条件：同上。 轴重：21t； 地质条件：冲积层。 参考点位置：离列车运行线路中心 30m 的地面处。
	80	78.5	
	90	79.0	
	100	79.5	
集装箱车	60-80	77.5	线路条件：同上。 轴重：25t； 地质条件：冲积层。 参考点位置：离列车运行线路中心 30m 的地面处。
	90-100	78.0	
	110	78.5	
	120	79.0	

振动达标距离预测：

为便于铁路沿线区域的规划控制，根据不同地质条件、不同线路形式、不同距离处的振动预测，并给出相应路段的振动达标距离，建议规划建设部门结合环境振

动控制要求，对本铁路线路两侧区域进行合理规划建设。

工程典型条件下，铁路振动衰减情况及达标距离预测见表 5-8。从表中可以看出，曲线改造段达标距离分别为 28m。

表 5-8 振动强度与达标距离预测表

路段	路基形式	速度		不同距离处振动值/dB				达标距离
		客车	货车	15m	30m	45m	60m	m
曲线改造段	路堤	120	80	82.7/82.7	78.7/79.7	76.2/76.2	73.7/73.7	28

3.环境空气影响

本段曲线改造项目不涉及车站，本项目运行期主要空气污染源是列车排放的少量尾气，且本项目周边无大气环境保护目标。因此，本次评价不采用估算模型进行计算，大气环境影响评价工作定为三级，仅做简单分析。

本项目运行期不排放大气污染物，因此，本项目运营期对环境空气无影响。

4.地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“8.1.2”可知：水污染影响型三级 B 评价，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。

上轮建设新开 5 处会让站生活污水、取暖设施、固废处理均按环评要求执行，本段曲线改造项目不涉及车站，运行期无生活废水和生产废水产生，且本项目周边不涉及地表水体，因此，本项目运行对地表水环境无影响。

5.固体废物环境影响分析

上轮建设新开 5 处会让站生活污水、取暖设施、固废处理均按环评要求执行，本段曲线改造项目 2 处曲线运行期无生活垃圾产生，对环境无影响。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）

2021 年 3 月 16 日由新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局批复，《关于对改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）环境影响报告表》，文号：喀地环评字字[2021]28 号。批复如下：

二、由中环联新（北京）环境保护有限公司编制的《改建铁路南疆线阿克苏至

喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环节影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确。同意喀什地区生态环境局伽师县分局的预审意见，并重点做好以下工作：

（一）施工期

1. 生态 本次曲线改造不占用耕地，本段征收用地 2.90hm，全部泡泡刺荒漠。施工生产生活区内主要有停放的施工机械、砂石料生产系统、拌和系统、施工期间施工人员居住的临时房屋及其它施工辅助工程。施工过程中采取洒水降尘，防止水土流失。

施工期间为严格控制和管理运输车辆及重型机械的行走范围，以防破坏地表结皮和植被，引发水土流失，需限制施工便道车辆的行驶范围。施工结束后，清除表层砾石，进行土地平整，播撒草籽，待自然恢复。

2. 噪声：选用低噪声设备和工艺；加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并于地面保持良好接触，有条件的应使用减震机座，降低噪声。合理划定运输路线，适当限制大型载重车的车速，定期对运输车辆维修、养护。加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。严禁夜间施工，昼间进行高噪声施工时应尽量选择不敏感时段进行，最大程度的减小施工噪声对周围环境敏感目标的影响。

3. 废气 封闭式施工，上料仓设置顶盖，三面均设置围挡及隔板加高，减少水泥、砂、石灰等物料堆放过程中扬尘对外环境产生影响。本项目建有 1 座拌合站，设 2 套拌合装置，每套拌合装置均设置一套 DMC 脉冲式布袋除尘装置。施工拌合过程中产生的粉尘经脉冲布袋式除尘装置收集处理后，满足达标排放。施工场地采用封闭式施工方法，将工地与周围环境分隔，在工地四周设置围护栏，以起到隔阻工地扬尘对周围环境的影响。道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。保持施工车辆及路面清洁，避免大风天气作业。

4. 废水：营地内生活污水采用卫生厕所进行处理，委托沿线环卫部门定期清运集中收集送指定地点处置。在场内设置三级沉淀池，对车辆冲洗废水、设备冲洗废水等进行沉淀处理，分离出水用于喷洒场地或道路。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需

集中堆放,并采取一定的防雨淋措施,及时清扫施工运输过程中遗洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷,污染周边环境。

5. 固废：对生活垃圾应加强管理，用垃圾桶密闭收集，设置专车定期收集施工人员的生活垃圾，集中密闭外运，严禁就地抛洒及无组织排放。禁止生活垃圾用于回填，以防止对地下水的污染。工程弃土全部回填至取土场。

三、该项目的实施要认真落实“三同时”制度、严格执行“报告表”中提出的各项环保措施，开展专项环境监理和监测工作；项目日常的环境监督管理由喀什地区生态环境局伽师县分局，生态环境保护综合执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设方对本项目进行竣工环境保护验收，验收合格后向地区生态环境局备案。如项目的性质、规模、地点、防治污染措施发生重大变动，须报我局重新审批。

表六：环境保护措施执行情况

项目 阶段	环境影响报告表及审批文件中要求的环保措施	环境保护措施 的落实情况	措施的执行效果及未采取措施的原因
施 工 期	生态影响 生态：本次曲线改造不占用耕地,本段征收用地 2.90hm,全部泡泡刺荒漠。施工生产生活区内主要有停放的施工机械、砂石料生产系统、拌和系统、施工期间施工人员居住的临时房屋及其它施工辅助工程。施工过程中采取洒水降尘,防止水土流失。 施工期间为严格控制和管理运输车辆及重型机械的行走范围,以防破坏地表结皮和植被,引发水土流失,需限制施工便道车辆的行驶范围。施工结束后,清除表层砾石,进行土地平整,播撒草籽,待自然恢复。	已落实	施工期多次组织宣传教育会议,施工单位制定严格的管理制度和奖惩制度,严禁猎杀野生动物、采摘野生植物。施工便道进行铺撒砾石处理,施工结束后,清除表层砾石,进行土地平整,播撒草籽,待自然恢复,施工期未发现随意碾压周边道路行为;取土场已采取平整削坡措施,留待自然恢复。未设置施工营地。
	污染影响 1. 噪声: 选用低噪声设备和工艺;加强检查、维护和保养机械设备,保持润滑,紧固各部件,减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固,并于地面保持良好接触,有条件的应使用减震机座,降低噪声。合理规划运输路线,适当限制大型载重车的车速,定期对运输车辆维修、养护。加强施工管理,合理安排施工作业时间,严格按照施工噪声管理的有关规定执行。严禁夜间施工,昼间进行高噪声施工时应尽量选择非敏感时段进行,最大程度的减小施工噪声对周围环境敏感目标的影响。 2. 废气 封闭式施工,上料仓设置顶盖,三面均设置围挡及隔板加高,减少水泥、砂、石灰等物料堆放过程中扬尘对外环境产生影响。本项目建有 1 座拌合站,设 2 套拌合装置,每套拌合装置均设置一套 DMC 脉冲式布袋除尘装置。施工拌合过程中产生的粉尘经脉	已落实	1. 施工单位在施工过程中使用低噪声的机械设备类型,高噪声设备采取了减震、隔声等措施,并在施工期及时进行保养维护,对设备使用人员进行了培训,严格按操作规范使用各类机械。施工期未发生噪声环保投诉事件。 2. 施工场地及施工便道定期洒水,施工期每天洒水 2-3 次;大风天气未开展施工作业,施工场地设置料棚,施工期粉性材料堆放在料棚内。混凝土、道砟均为商购。运输车辆已落实篷布遮盖。施工现场已设置围挡,开挖废弃土方合理堆放,无随意抛洒现象。施工场地采取封闭式施工,拌合站设置了 2 套 DMC 脉冲式布袋除尘装置,粉尘经脉冲布袋式除尘装置收集处理后,能满足达标排放。 3. 项目未设置施工营地,租用沿线附近居民用房,生活污水依托现有设施处置。

		冲布袋式除尘装置收集处理后,满足达标排放。施工场地采用封闭式施工方法,将工地与周围环境分隔,在工地四周设置围护栏,以起到阻隔工地扬尘对周围环境的影响。道路及施工场地要每天定期洒水,抑制扬尘产生,在大风日加大洒水量及洒水次数。保持施工车辆及路面清洁,避免大风天气作业。 3. 废水: 营地内生活污水采用卫生厕所进行处理,委托沿线环卫部门定期清运集中收集送指定地点处置。在场内设置三级沉淀池,对车辆冲洗废水、设备冲洗废水等进行沉淀处理,分离出水用于喷洒场地或道路。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨淋措施,及时清扫施工运输过程中遗洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷,污染周边环境。 4. 固废: 对生活垃圾应加强管理,用垃圾桶密闭收集,设置专车定期收集施工人员的生活垃圾,集中密闭外运,严禁就地抛洒及无组织排放。禁止生活垃圾用于回填,以防止对地下水的污染。工程弃土全部回填至取土场。		4. 项目设置有垃圾桶,生活垃圾集中收集至垃圾桶,定期送至环卫部门集中处理。施工废气土方合理堆放运至取土坑;建筑垃圾集中收集后运至指定填埋场回填处理。
	社会影响	/	/	/
运营期	生态影响	/	/	
	污染影响	/	/	/
	社会影响	/	/	/

表七：环境影响调查

施 工 期	生态影响	（1）对植被影响及保护措施 本次工程主要为线路改线引起新增用地，征收永久用地 2.90hm²，均为泡泡刺荒漠，占用土地为既有铁路两侧土地，占用面积较小，对沿线土地资源的影响较小。 施工前，对永久占地表土进行剥离，用于临时占地绿化。施工期严格控制施工范围，施工便道进行铺撒砾石处理，施工结束后，清除表层砾石，进行土地平整，播撒草籽，待自然恢复。 （2）对野生动物影响及保护措施 ①施工期多次组织宣传教育会议，施工单位制定严格的管理制度和奖惩制度，严禁猎杀野生动物。 ②新建施工便道选择在荒地或裸地。 ③施工单位加强卫生防疫工作，避免疾病蔓延。 （3）临时占地影响及保护措施 1）取土场、弃渣场 本项目 2 处曲线改造以填方为主，为了减缓取土对沿线生态环境影响，利用 G3012 阿克苏至喀什高速公路取土场 1 处，位于 ***，占地 5.13hm²，占地类型为未利用土地。本项目路基、桥涵挖除弃土 2964m³，取土量为 68464m³，弃方量远小于取土量，工程可利用取土场作为弃土场，不需设置专用弃土场。 全线实际使用取土场 1 处，施工前剥离表土，临时堆放在取土场附近，并采取苫盖措施，现状已完成场地平整并回覆表土，削缓边坡，播撒草籽，留待自然恢复。 2）施工营地、施工便道 本段施工场地利用既有取土场区布设，不新增占地，施工期结束后交由租赁方恢复。
	污染影响	（1）废气污染调查： 施工期大气污染源主要来源于站场施工、取弃土、汽车运输等产生的扬尘和各种机械设备产生的尾气，施工期以扬尘污染为主，特别是运输车辆引起的扬尘污染强度较大。①施工单位设置料棚，施工期粉性材料堆放在料棚内，施工场地及施工便道定期洒水，施工期每天洒水 2-3 次；②运输车辆进出施工区域尽量依托临近道路行进，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并要求运输车辆减缓行车速度；③加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少了烟尘和尾气的排放；④施工场地采用封闭式施工方法，拌合站设置了 2 套 DMC 脉冲式布袋除尘装置，粉尘经脉冲布袋式除尘装置收集处理后，能满足达标排放； （2）废水污染调查：本工程新建桥梁、涵洞工程量较小；道砟采取商购，选择正规石料场进行采购，拉运至施工现场，直接进行铺设，不在现场储存；钢轨由火车拉运至施工现场，直接进行铺设；施工现场不存放柴油、汽油等油品，每次由加油站按需运至施工现场进行加油作业。项目未设置施工营地，租用现有居民用房，生活污水依托居民现有污水设施处置排放。 （3）噪声污染调查：本项目噪声源主要集中在施工过程中各种施工机械设备的运转和车辆的运行。由于本项目施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，建设方已严格落实环评要求，选用低噪声设备，严格控制夜间施工。 （4）振动环境影响：施工期振动环境影响主要有打桩、钻孔、空压机、大型挖掘机、回填中夯具的使用以及重型车辆在道路上的行驶等。施工单位在施工过程中对机械

		设备及时进行保养维护，对设备使用人员进行了培训，严格按操作规范使用各类机械。 （5）固体废物污染调查：生活垃圾设置垃圾桶密闭收集，委托当地环卫部门定期拉运处置。工程弃土全部回填至取土坑。 根据调查了解，在项目施工过程中，通过积极落实各项污染防治措施，对施工过程中产生的固体废物管理较为有序，没有对周围环境造成明显污染，在本项目施工期间，没有收到有关本项目固体废物污染的环保投诉。
	社会影响	根据建设单位和施工单位提交的资料、报告，在施工之前，建设单位和施工单位制定了合理的施工时间，尽可能的降低了项目施工对周边环境带来的不利影响。随着施工工作的结束，项目区恢复原有状态，将不再产生影响。
运营期	生态影响	运行期对野生动物的负面影响不大，未发生捕猎保护动物的现象。
	污染影响	①废气污染调查：运营期正常工况无生产废气排放。 ②噪声污染调查：本项目属于提速改造项目，改建后线路位置维持原有状况不变和评价范围内的建筑物分布状况不变，沿线改造段无声环境敏感点存在。 ③固体废物污染调查：本次提速改造工程不涉及车站改建，上轮建设新开 5 处会让站生活污水、取暖设施、固废处理均按环评及批复要求落实，本段曲线改造项目 2 处曲线运行期无生活垃圾产生，对环境无影响。 ④振动环境调查：本项目属于提速改造项目，改建后线路位置维持原有状况不变和评价范围内的建筑物分布状况不变，沿线改造段无振动环境敏感点存在。 ⑤废水污染调查：本次提速改造工程不涉及车站改建，上轮建设新开 5 处会让站生活污水、取暖设施、固废处理均按环评及批复要求落实，本次改造运行期无生活废水和生产废水产生，且本项目周边不涉及地表水体，因此，本项目运行对地表水环境无影响。

表八：环境质量及污染源监测

1.声环境监测及评价

本次监测委托新疆中测测试有限责任公司采用 AWA6228 型噪声级计进行。

1.1 监测方法、监测时间

衰减断面监测：选择平均车流密度的一小时测量敏感点昼间、夜间等效声级

测量频次：1h 等效声级，连续监测 2 天，每天昼间、夜间各监测 1 次。

监测时间：2021 年 4 月 22 日~4 月 23 日。

1.2 评价标准

运营期距铁路外轨中心线 30m 处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》及其修改方案（GB12525-90）中昼间 70dB，夜间 70dB 的标准；

距铁路外轨中心线 30-60m 处执行《声环境质量标准》中的 4a 类标准；

60m 以外执行《声环境质量标准》中的 2 类标准；

评价范围 200m 以内的学校、医院等噪声敏感点执行《声环境质量标准》中的 2 类标准。

1.3 监测结果

噪声监测结果见表 8-1。

表 8-1 噪声监测结果

检测时间		检测点位		距线路距离 (m)	检测结果 dB(A)		标准 限值
					4 月 22 日	4 月 23 日	
昼间	08:30	衰减断面 (***)	01	30	67.0	67.3	70
	08:30		02	60	57.2	57.3	70
	08:30		03	120	55.7	56.0	60
夜间	01:00	衰减断面 (***)	01	30	48.6	48.3	70
	01:00		02	60	47.0	47.2	55
	01:01		03	120	45.9	46.3	50

1.5 评价结果

监测数据表明：距铁路外轨中心线 30m 处昼、夜间测量噪声均满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》及其修改方案（GB12525-90）标准要求；距铁路外轨中心线 60m 处昼、夜间测量噪声满足《声环境质量标准》中的 4a 类标准要求；距铁路外轨中心线 120m 处的测点昼、夜间测量噪声满足《声环境质量标准》中的 2 类标

准要求。

2. 振动环境监测及评价

本次监测委托新疆中测测试有限责任公司采用 AWA6256B⁺型环境振级分析仪进行。

2.1 监测方法、监测时间

按照《环境振动监测技术规范》(HJ 918-2017)，有铁路振动影响的区域按照“铁路振动”测试方法进行测量，以列车通过时最大振级 VLzmax 的作为评价量。由于本线货运车辆不固定，列车全天密度较低，按照《铁路环境振动测量》(TB/T3152-2007)，以昼间 4 小时，夜间 2 小时通过列车算术平均值的作为监测值。振动监测量为铅垂向振级的最大值。

本次检测时间为 2021 年 4 月 22 日~4 月 23 日。

2.2 评价标准

运营期距铁路外轨中心线 30m 以外区域执行《城市区域环境振动标准》(GB1070-88) 中昼间 80dB，夜间 80dB 的标准；

2.3 监测结果

振动监测结果见表 8-2。

表 8-2 振动监测结果

检测时间		检测点位		距线路距离（m）	检测结果 VLzmax, d		限值
					B(A)		
					4 月 22 日	4 月 23 日	
昼间	13:00-17:00	衰减断面 （***）	01	30	73.28	74.13	80
			02	60	67.07	67.89	80
夜间	02:00-04:00	衰减断面 （***）	01	30	71.59	71.46	80
			02	60	66.08	66.50	80

2.5 评价结果

从监测结果可知，现状受铁路振动干扰的环境振动值均低于“80dB”标准限值，满足标准要求。

项目	监测时间及监测频次	监测点位	监测项目	监测结果分析
生态	2021 年 4 月 22 日	施工场地	自然植被 场地平整	经现场调查,本项目取弃土场均已及时进行土地平整,回填表层土,促进场区自然恢复。
水	/	/	/	/
大气	/	/	/	/
噪声	2021 年 4 月 22-23 日 衰减断面连续监测 2 天,每天昼间、夜间各 监测 1 次	衰减断面:30m、60m、120m	等效连续 A 声级	衰减断面:距铁路外轨中心线 30m 处昼、夜间测量噪声均满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》及其修改方案(GB12525-90)标准要求;距铁路外轨中心线 60m 处昼、夜间测量噪声满足《声环境质量标准》中的 4a 类标准要求;距铁路外轨中心线 120m 处的测点昼、夜间测量噪声满足《声环境质量标准》中的 2 类标准要求。
振动	2021 年 4 月 22-23 日 各衰减断面连续监测 2 天,每天昼间、夜间各 监测 1 次	衰减断面:30m、60m	铅垂向振级的最大值	从监测结果可知,现状受铁路振动干扰的环境振动值均低于“80dB”标准限值,满足标准要求。
其他	/	/	/	/

表九：环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期）

1.施工期环境管理

本工程建设坚持实行“环保型施工”，即对施工场地生态环境贯彻“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，树立“原始的就是最美的，不破坏就是最好的保护”的观念，坚持做到最大限度的保护，最小限度的破坏，最大限度的恢复。坚持“谁污染谁治理，谁开发谁保护”的原则。为此，项目指挥部成立了专门的环境保护领导小组，具体负责实施本项目施工期和营运期的环境管理工作，并在地方环保局的监督下，同时进行环保工作的管理。

项目指挥部对各施工合同段规定：环境保护工作要与铁路工程同步实施。施工单位配备一定数量的环境保护设施和技术人员，建立环保检查制度，把环保措施层层落实，做到责任到人，奖罚分明，采取行之有效的施工措施。由项目施工期环境监理组成现场检查组，具体实施环保检查、督促、处理的职能，切实加强工程建设环境保护和防止水土流失的现场管理，及时发现问题及时处理，加大现场稽查力度，努力做好环保现场管理工作。

为了实现在施工中最小程度的破坏生态，并在交工后最大程度的恢复生态，指挥部针对施工前的施工临时用地、施工便道以及取弃土场的选址等诸多方面做了认真调查和综合考虑。在施工阶段对清表、路基开挖工程环境保护等方面都有明确的规定和处理办法，并严格要求所管队伍，提高员工的环保意识，在施工中严格贯彻各项有关环保方面的管理制度和执行有关环保的法规、政策。

2.运营期环境管理

营运期生态环境由铁路沿线各站段统一管理，由指挥部环水保办公室负责具体工作。铁路周边绿化由沿线各站段进行管理与养护。

工程建设期加强了对各项环保制度的落实和教育工作，严格各项环保制度和措施的落实工作，对施工单位施工过程中出现的废水、固废进行严格控制，对固废集中处理，并运送到指定地点，及时签订环境保护合同和目标责任书；定期对取土场进行全面检查，按照环保部门的要求，对取土场进行恢复，对各施工单位污水处理、

生活垃圾转运等方面进行严格监管，施工便道有专车洒水养护，有效地避免了扬尘现象；取土场使用完毕后，按设计实施工程防护，采取削坡等措施；各单位购置绿色防护网等环保材料和设施，及时对便道及边坡弃土进行防护。工程基本落实了环评要求，执行了环境影响评价制度，完成了各项环境保护设计。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况

项目落实了环评报告表中的生态环境保护和污染防治措施，施工期建设方委托新疆中测测试按环评报告要求项目及频次进行监测，根据环评中提出的监测计划见表 9-1，在本项目通过验收正式投产后，应按表 9-1 的要求进行环境监测。

表 9-1 环境监测计划

阶段	项目	监测点位	监测内容	监测方法	监测时段	备注
施工期	水环境	施工场地废水排放处	PH、SS、COD、BOD 5、石油类	按照监测技术规范取样、化验、分析	3 次/年	监测项目
	环境空气	施工场地场界处	TSP	按照监测技术规范取样、化验、分析	3 次/年	
	生态环境	取土场	按指定地点取土情况及取土场恢复情况	实地调查	定期与不定期	监控项目
		施工场地	恢复情况	实地调查	定期与不定期	
		施工便道	车辆下道行驶情况及施工结束后便道恢复情况	实地调查	定期与不定期	
	生产生活垃圾	施工营地、施工场地	集中堆放，定期处理情况	实地调查	3 次/年	

环境管理状况分析与建议

经本次验收调查，本工程落实了国家、地方及有关行业关于风险事故防范与应急方面相关规定，编制了《改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）突发环境事件应急预案》，并已取得了备案，配备了必要的应急设施，设置了完善的环境风险事故防范与应急管理机构，建立了安全保护、维护保养和巡线检查制度。根据现场调查可知，截止验收期间未发生突发环境事件。

总体来看，建设单位施工期、运营期建设了相应环境管理机构，基本执行国家和自治区环境管理方面有关要求，制定有各项环境管理制度，安排专职或兼职人员负责落实或监督施工单位落实环评报告书及其批复提出的各项环保措施和设施，取得了较好的效果。

表十：调查结论与建议

调查结论与建议：**1.调查结论****（1）工程建设内容**

本工程环评批复主要建设内容为：本次喀什地区段共有 2 处曲线改造工程，主要建设内容为：***段改造引起的路基、桥涵等图件工程，占地面积 29000m²。总投资 3026.92 万元，环保投资约 65 万元，占工程总投资的 2.15%。

与环评相比，已建工程内容建设地点、生产规模、性质、工艺、污染防治与生态保护措施与环评文件及批复基本一致。

（2）生态环境影响调查结论

本工程在建设和调试运行期间基本落实了环评中提出的各项生态环境保护措施。根据调查，本次工程主要为线路改线引起新增用地，征收永久用地 2.90hm²，均为泡泡刺荒漠，占用土地为既有铁路两侧土地，占用面积较小，对沿线土地资源的影响较小。施工期多次组织宣传教育会议，施工单位制定严格的管理制度和奖惩制度，严禁猎杀野生动物、采摘野生植物。施工前，对永久占地表土进行剥离，用于临时占地绿化。施工期严格控制施工范围，施工便道进行铺撒砾石处理，施工结束后，清除表层砾石，进行土地平整，播撒草籽，待自然恢复；取土场已采取平整削坡措施，留待自然恢复。未设置施工营地。

（3）水环境影响调查结论

本工程新建桥梁、涵洞工程量较小；道砟采取商购，选择正规石料场进行采购，拉运至施工现场，直接进行铺设，不在现场储存；钢轨由火车拉运至施工现场，直接进行铺设；施工现场不存放柴油、汽油等油品，每次由加油站按需运至施工现场进行加油作业。项目未设置施工营地，租用现有居民用房，生活污水依托居民现有污水设施处置排放。

运营期本次提速改造工程不涉及车站改建，上轮建设新开 5 处会让站生活污水、取暖设施、固废处理均按环评及批复要求落实，本次改造运行期无生活废水和生产废水产生，且本项目周边不涉及地表水体，因此，本项目运行对地表水环境无影响。

（4）大气环境影响调查结论

施工场地及施工便道定期洒水，施工期每天洒水 2-3 次；大风天气未开展施工作业，施工场地设置料棚，施工期粉性材料堆放在料棚内。混凝土、道砟均为商购。运输车辆已落实篷布遮盖。施工现场已设置围挡，开挖废弃土方合理堆放，无随意抛洒现象。施工场地采取封闭式施工，拌合站设置了 2 套 DMC 脉冲式布袋除尘装置，粉尘经脉冲布袋式除尘装置收集处理后，能满足达标排放。运营期正常工况无生产废气排放。

（5）声环境影响调查结论

本项目属于提速改造项目，改建后线路位置维持原有状况不变和评价范围内的建筑物分布状况不变，沿线改造段无声环境敏感点存在。

验收调查阶段，根据新疆中测测试有限责任公司于 2021 年 4 月 22~23 日监测数据表明：监测数据表明：距铁路外轨中心线 30m 处昼、夜间测量噪声均满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》及其修改方案（GB12525-90）标准要求；距铁路外轨中心线 60m 处昼、夜间测量噪声满足《声环境质量标准》中的 4a 类标准要求；距铁路外轨中心线 120m 处的测点昼、夜间测量噪声满足《声环境质量标准》中的 2 类标准要求。

（6）振动环境影响调查结论

本项目属于提速改造项目，改建后线路位置维持原有状况不变和评价范围内的建筑物分布状况不变，沿线改造段无振动环境敏感点存在。

验收调查阶段，根据新疆中测测试有限责任公司于 2021 年 4 月 22~23 日监测数据表明，现状受铁路振动干扰的环境振动值均低于“80dB”标准限值，满足标准要求。

（7）固体废弃物调查结论

本次提速改造工程不涉及车站改建，上轮建设新开 5 处会让站生活污水、取暖设施、固废处理均按环评要求执行，本段曲线改造项目 2 处曲线运行期无生活垃圾产生本次提速改造工程不涉及车站改建，运行期无生活垃圾产生，对环境无影响。

（8）环境管理

从“三同时”执行情况看，本工程实现了环保设施与主体工程同时设计、同时

施工、同时投入使用。落实了国家、地方及有关行业关于风险事故防范与应急方面相关规定，编制了《改建铁路南疆线阿克苏至喀什段提速改造工程（喀什地区段 2 处曲线改造工程）突发环境事件应急预案》，配备了必要的应急设施，设置了完善的环境风险事故防范与应急管理机构，建立了安全保护、维护保养和巡线检查制度。根据现场调查可知，截止验收期间未发生突发环境事件。

（8）调查结论

综上所述，建设单位基本落实了环评及批复中提出的生态保护和污染治理措施，噪声、振动监测结果满足相应标准要求，固体废物得到合理处置，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

2.要求

（1）本工程通过竣工环境保护验收后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）第十三条的第一款规定，验收报告公示期满后 5 个工作日内，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。

（2）按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）第十三条第二款的规定，中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。
